

浜名湖大橋橋梁修繕工事 工事概要

1) 工事概要

工事名 : 平成30年度道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(債務)(一)館山寺弁天島線(浜名湖大橋)橋梁修繕工事
 工事場所 : 浜松市西区村櫛町地内
 工事期間 : 平成31年3月下旬～平成31年10月下旬
 工事内容 : 橋梁修繕工(断面修復工・ひび割れ注入工・表面含浸工・舗装工)


2) 工程表

工種	平成31年3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工・片付け	■															
断面修復工			■													
ひび割れ注入工			■													
表面含浸工			■													
舗装工			■													
片側交互規制	■		■													
吊足場設置期間	■		■													

3) 現場位置図




4) 吊足場養生方法

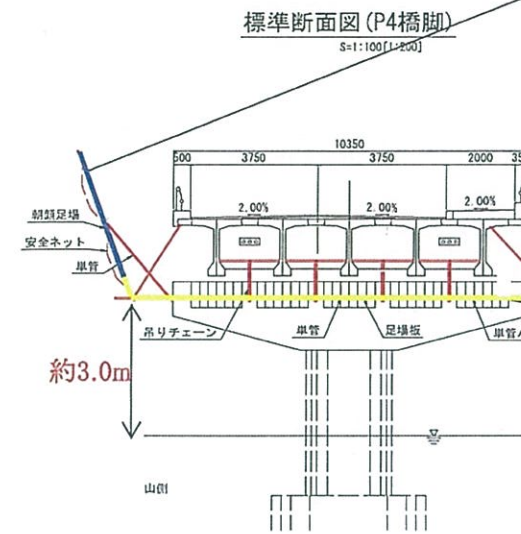

5) 施工時の注意事項

- ① 施工休日について
 - ・工事期間中の休日は土曜・日曜日となります。(作業状況により変更する場合があります。)
 - ・ゴールデンウィークは休工とします。(期間:5/3～5/6)
 - ・夏期休暇は休工とします。(期間8/10～8/18)
- ② 吊足場の施工について
 - ・吊足場の設置は航路外となります。
 - ・吊足場設置完了後、床全面にシートと板張を設置し、資材等の落下防止に努めます。吊足場の側面にはメッシュネット又はパネルを設置して資材等の飛散防止を行います。
 - ・吊足場には船舶の接触防止対策として赤色系の点滅灯を設置します。また、吊足場の側面には頭上注意の横断幕を設置して、注意喚起を行います。
 - ・吊足場から水面までは約3.0mの高さを確保しています。
 - ※吊足場の下を通過する場合は、十分に注意して通行をお願いします。
- ③ 監視船について
 - ・吊足場を施工するときは上手と下手に監視船を配置して作業を行います。

注意喚起用横断幕(イメージ)



問合せ先
 発注者 : 浜松市 南土木整備事務所 道路保全G 山本 電話番号 053-457-1018
 施工業者 : 中村建設株式会社 渡部 佳浩 電話番号 053-471-3223
